

N° DP 24/468

DECISION DU PRESIDENT

AVENANT N°1 AU MARCHE 23MRL06 MARCHE ORDINAIRE DE TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DU PÔLE DE VALORISATION DE HYERES - LOT 3 : GENIE CIVIL MENUISERIES EXTERIEURES

Le Président de la Métropole

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l'Article R2194-5 du Code de la Commande Publique indiquant que le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir,

VU le décret n°2017-1758 en date du 26 décembre 2017 portant création de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

VU la délibération n°23/05/078 du 4 mai 2023 portant délégations au Président et au Bureau,

VU le marché ordinaire n°23MRL06 portant sur des travaux de mise en conformité du pôle de valorisation de Hyères-les-Palmiers – Lot 03, pour une durée de 9 mois pour un montant total de 418 095.10 € H.T. et notifié à COLAS le 23/03/2023,

VU le projet d'avenant n°1, ci-annexé,

VU l'avis de la Commission MAPA du 28/05/2024,

CONSIDERANT que le marché prévoyait le positionnement du bassin dans les espaces verts situés entre l'entrée au site et la route des marais, cet espace vert protégé existant dans le PLU depuis 2016 mais n'apparaît pas dans les documents graphiques du DCE et n'a pas été pris en compte par le maître d'œuvre lors de la conception,

CONSIDERANT que l'entreprise a proposé lors de la phase de préparation de déplacer ce bassin vers la plateforme basse, ce que le MOA (maître d'œuvre) a accepté,

CONSIDERANT que lors des travaux de terrassement réalisés sous rabattement de nappe, le défaut de blindage et la configuration du rabattage ont conduit à des effondrements de berges menaçant les ouvrages existants et notamment les voies publiques et les quais de la déchèterie. L'absence de protections et de méthodologie d'exécution adaptée ont conduit notamment le CSPS à demander l'interruption des travaux de terrassement en raison de dangers graves et imminents constatés,

CONSIDERANT que les conclusions géotechniques d'une expertise diligentée en urgence par le maître d'ouvrage ont mis en avant les risques de ruines des quais avoisinants et l'effondrement de la route du SITTO MAT, recommandant le remblaiement immédiat en ballast confiné par du géotextile. Ces travaux ont été réalisés par l'entreprise dans le respect des prescriptions géotechniques,

CONSIDERANT que ces prestations rendent nécessaires l'ajout de prix nouveaux au BPU valant DEC, des ajustements de quantités, ainsi que la prolongation du délai d'exécution,

CONSIDERANT que modifications entraînent une augmentation du montant initial du marché de 60 326.30 € HT, soit 14.43 % et une prolongation du délai d'exécution jusqu'au 30.09.24,

D E C I D E

ARTICLE 1

DE SIGNER l'avenant 1 au marché 23MRL06 – LOT 3 avec COLAS pour un montant de 60 326.30 € HT.

ARTICLE 2

DE DIRE que les crédits sont inscrits au Budget Principal – DGDCV – Opération budgétaire 2378 – Investissement – Imputation budgétaire 21351 – Opération de travaux 30OT2019.

La présente Décision sera


- transmise à Monsieur le Préfet
- reproduite sur le Registre ouvert à cet effet
- affiché sur les panneaux destinés à cet effet
- communiquée sous forme de donner acte du Conseil Métropolitain lors de sa prochaine séance

Fait à Toulon, le **10 JUIN 2024**

Jean-Pierre GIRAN

Président de la Métropole
Toulon Provence Méditerranée



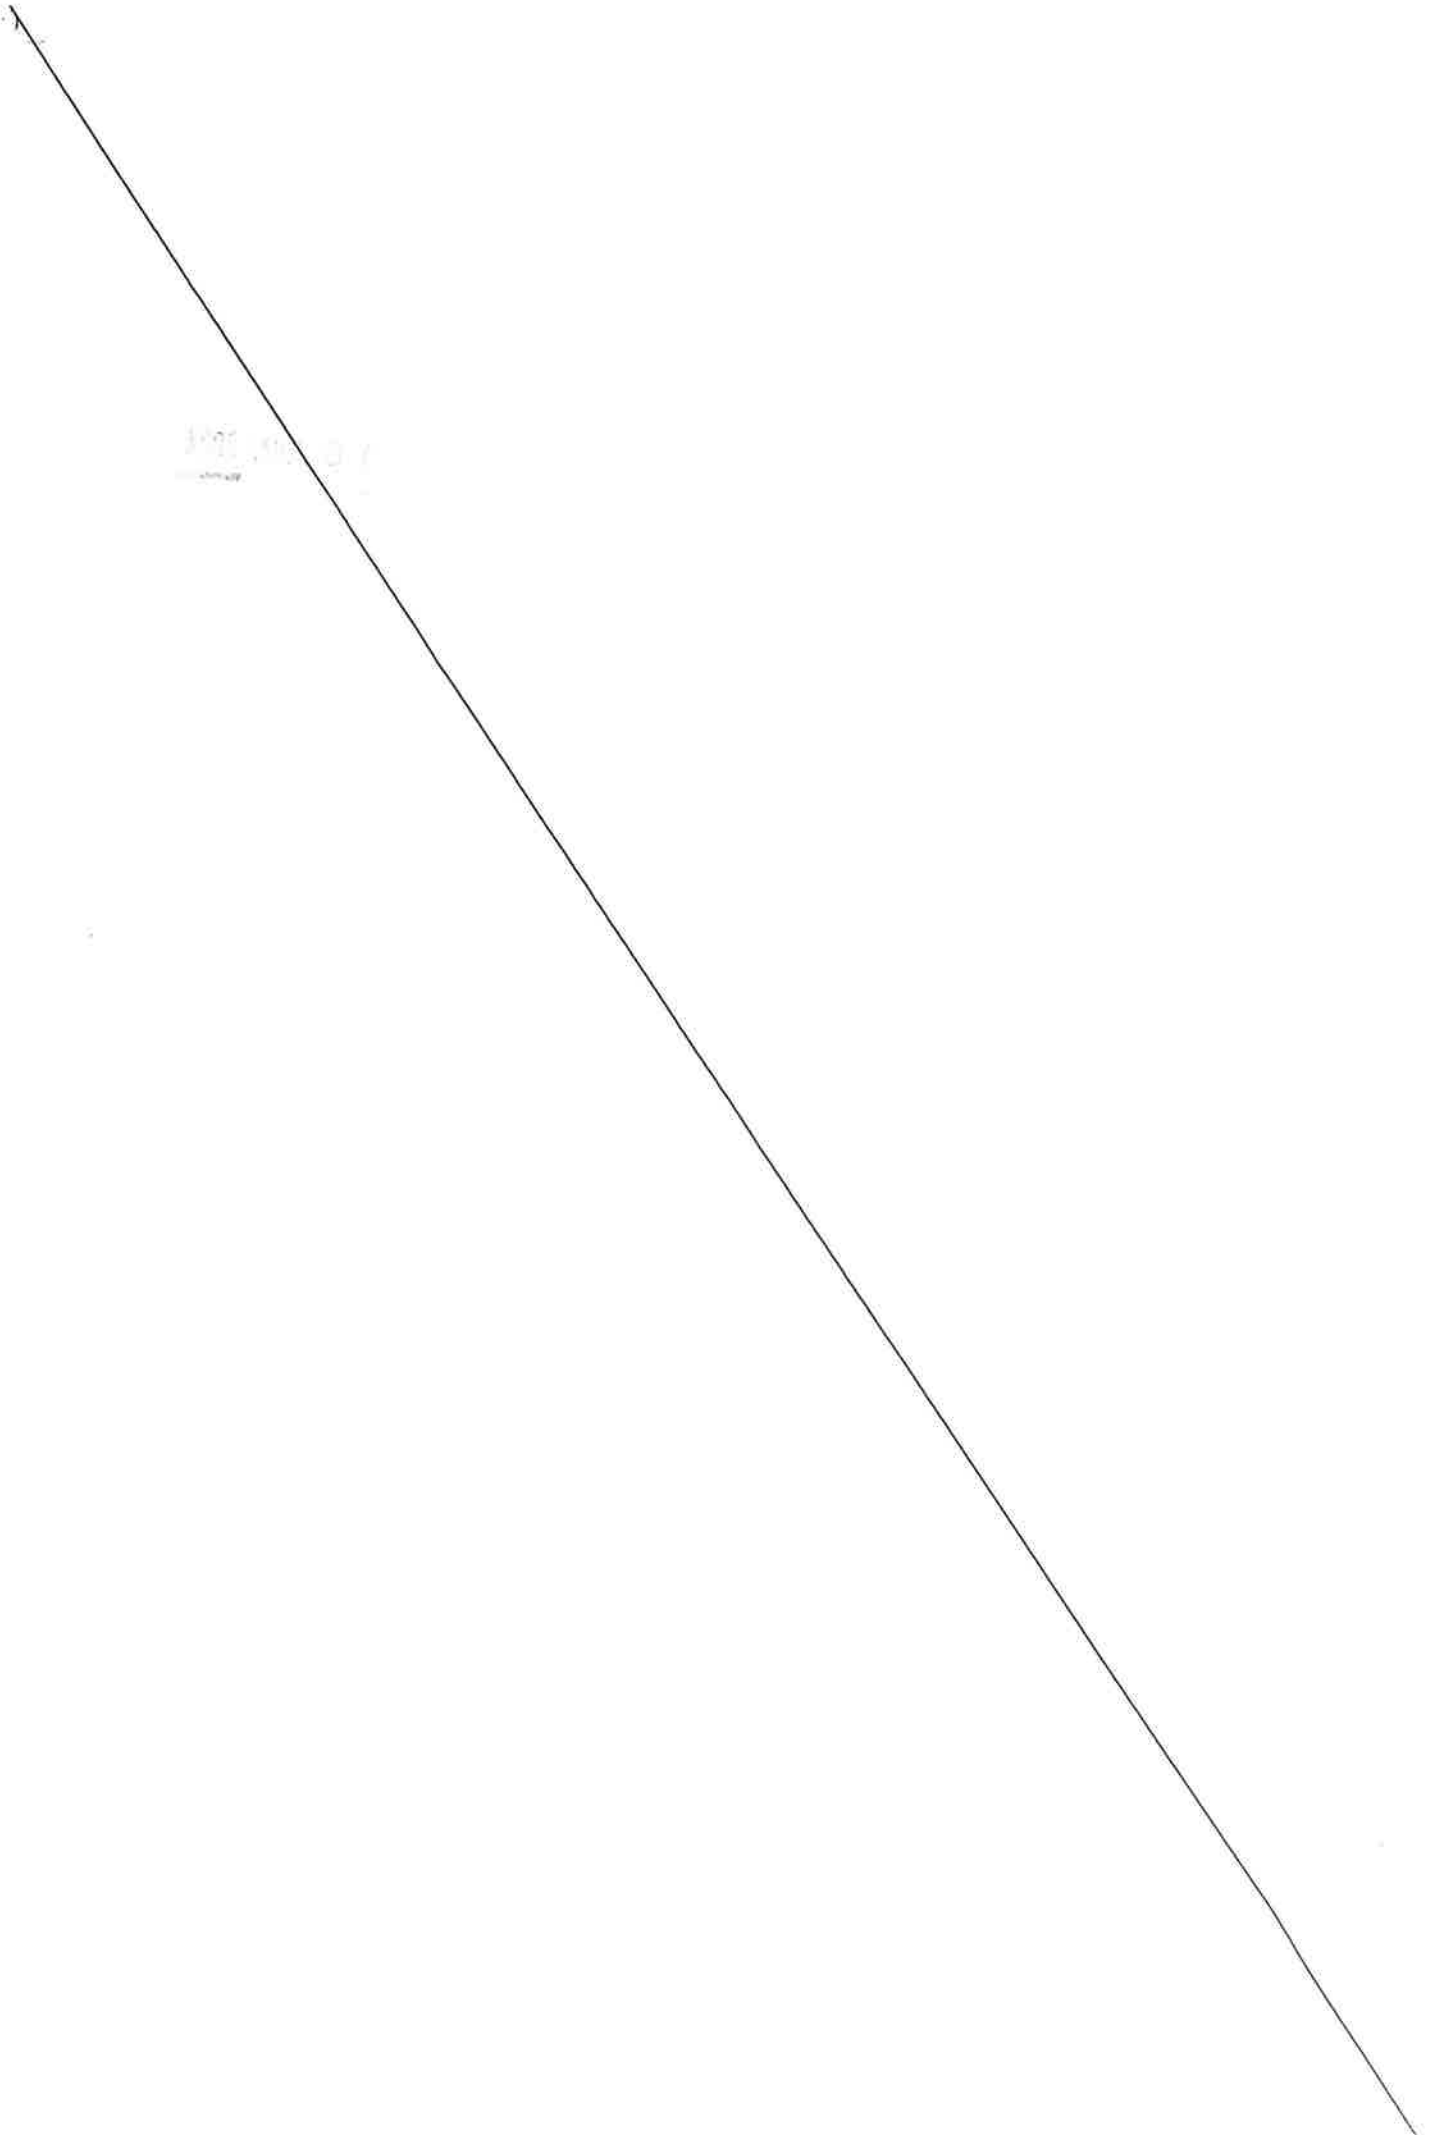

MARCHE N°23MRL06

**MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX – TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE DU PÔLE
DE VALORISATION DE HYERES –
LOT N°3 GENIE CIVIL – MENUISERIES EXTERIEURES
AVENANT N° 1**

A - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MARCHE
--

Etablissement Public :	Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président en exercice ;
Direction :	Direction Stratégie, Prévention, Collecte et Valorisation des Déchets
Titulaire initial de l'accord-cadre :	COLAS représentée par Monsieur Benjamin ALLAIS
Date de notification :	30/03/2023
Montant du marché :	418 095.10 € H.T.
Imputation budgétaire :	Budget Principal – DGDCV – Opération budgétaire 2378 – Investissement – Imputation budgétaire 21351 OT : 30OT2019
Annexe :	Nouveau BPU valant DEC; ordres de service

ENTRE LES SOUSSIGNES

Monsieur Jean-Pierre GIRAN, Président, agissant au nom et pour le compte de la Métropole Toulon Provence Méditerranée,

D'une part,

Et

Monsieur Benjamin ALLAIS - agissant au nom et pour le compte de COLAS

IL A ETE ENTENDU ET CONVENU CE QUI SUIT :

B - OBJET DE L'AVENANT

Article 1 : Rappel du contexte et objet du marché initial

Le présent avenant est dû à :

- La découverte de terres polluées en cours de travaux nécessitant le stockage et l'évacuation
- La mise au point technique du projet, consécutif notamment à la présence d'un espace boisé protégé au niveau de la zone prévue pour la zone d'épandage des eaux usées traitées et du bassin de confinement des eaux d'extinction d'incendie. Cet espace vert protégé existe dans le PLU depuis 2016 mais n'apparaît pas dans les documents graphiques du DCE et n'a pas été pris en compte par le BET lors de la conception. Lorsque le MOA l'a signalé durant la période de préparation, l'entreprise a proposé le déplacement du bassin au point bas. Lors des terrassements nous avons fragilisé les quais en décompressant les terres. Nous avons pris la décision de positionner le bassin sous le futur nouveau quai, mais les terres extraites lors de ces terrassements se sont avérées polluées. Ceci nous a entraîné vers un surcoût, des prix nouveaux et une augmentation des délais, objet de ce présent avenant.

Article 2 : Prix nouveaux et ajustements de quantités

Après études de solutions alternatives, le MOE a présenté une solution de retenue équivalente validée par le maître d'ouvrage consistant à :

- Déplacer le bassin enterré (B1) vers la plateforme haute des quais pour un volume de remplissage total de 200m³ dont 80m³ en gravitaire
- De créer un bassin à ciel ouvert (B2) d'une capacité de stockage gravitaire de 120m³
- Un système de réseau en infrastructure permettant les opérations de pompages de B2 vers B1 en cas de production d'eau d'extinction polluées.

Cette modification impacte la méthodologie de réalisation et conduit à une prolongation de délais d'exécution de la phase 2 concernant l'ensemble des lots.

Il convient donc d'ajouter des prix nouveaux au B.P.U. valant D.E.C. (Bordereau des prix unitaires valant détail estimatif contractuel) :

*** PROLONGATION DES DELAIS D'EXECUTION**

1/ Prix nouveau n°01 : Ce prix rémunère au forfait mensuel l'ensemble des frais direct et indirect liés au maintien des installations de chantier (sur la base de la description du prix III-101), ainsi que la signalisation (sur la base de la description du prix III-103). Ce prix s'applique pour toutes les prolongations notifiées par le maître d'ouvrage par voie d'OS et/ou avenant. L'application de ce prix concernent uniquement des allongements dont la responsabilité n'est pas exclusivement imputable au titulaire.

N° de prix	Désignation	Unité	Prix Unitaire en Euros HT	Quantité	Total en Euros HT
PN1	Maintien des installations et de la signalisation	mois	2 798,00	2,00	5 596,00

La durée d'indemnisation convenue est celle correspondant à la prolongation de la durée d'exécution postérieure à l'OS N° 3 établie forfaitairement à 2 mois.

Les prix ont fait l'objet d'un prorata des prix N°1101 et 1105 sur la base de 1/8 (sur une base de 8 mois de délais contractuel du marché)

***MODIFICATION DES AMENAGEMENTS FONCTIONNELS**

2/ Prix nouveau n°02 : Plus-value au prix III 201 pour hauteur totale de mur pour quais > 2,00m

Ce prix rémunère au mètre carré la plus-value à appliquer au prix III-201 pour une hauteur de mur de quai supérieure à 2,00m. La hauteur prise en compte est celle provenant de la différence altimétrique entre la plateforme supérieure et inférieure, mesurée à l'axe du quai. Cette plus-value rémunère l'ensemble des travaux définies au prix III-201 et notamment :

- Les volumes de terrassements masse complémentaires
- Les terrassements pour l'élargissement de la semelle
- L'augmentation du volume de la semelle
- Le remplacement des agglos à bancher par un mur coffré banché intégralement
- L'augmentation de la section du mur
- L'augmentation des ratios d'acier
- Le traitement des joints de dilatation et de fractionnement
- L'adaptation de la méthodologie de réalisation, des moyens matériels et notamment les grutages et pompages
- La mise en place des échafaudages, passerelles et plateforme de travail
- Y compris toutes sujétions de pose et finition

N° de prix	Désignation	Unité	Prix Unitaire en Euros HT	Quantité	Total en Euros HT
PN 2	Plus-value au prix III 201 pour hauteur totale de mur pour	ml	148,00	360,00	53 280,00

	quais > 2,00m				
--	---------------	--	--	--	--

2.1.1 3/ Prix nouveau n°03 : Mise en œuvre de béton C20/C25 sous semelle béton

Pour répondre aux adaptations des ouvrages, et notamment la proximité du bassin B2 de stockage des eaux d'extinction, et afin de respecter les règles parasismiques notamment de pente > 1/3 entre niveaux de fondation d'ouvrage, il est prévu d'approfondir ponctuellement les semelles de mur de quai. Le présent prix permet de rétribuer les volumes supplémentaires de béton qui seront rémunérés sur la base des quantités réellement mis en œuvre. Ce prix comprend :

- Les terrassements complémentaires et l'évacuation des déblais
- La fourniture et mise en œuvre de béton C16/C20
- L'ensemble des moyens méthodologiques de réalisation et notamment le coulage à la benne sous grue, pompages ou autres moyens adaptés
- Toutes sujétions de mise en œuvre

N° de prix	Désignation	Unité	Prix Unitaire en Euros HT	Quantité	Total en Euros HT
PN 3	Mise en œuvre de béton C20/C25 sous semelle béton	ml	145,00	40,00	5 800,00

4/ Prix nouveau n°04 : Plus-value au prix III 205 pour traitement structural de parements existants

Les prestations ci-après ont été demandées par le maître d'œuvre. Le démontage des habillages et protections de quai a fait apparaître des éclatements de béton et des mises à nues ponctuelles d'aciers structuraux. La rémunération des présents travaux de reprises s'applique au m2 en plus-value au III-205, et comprend :

- Le nettoyage haute pression du mur existant
- Le sondage des parements et le piquage des décollements
- Le brossage des aciers mis à nue
- La passivation des aciers
- L'application d'un primaire d'accroche
- L'application d'un enduit de protection de type LHM à base de résine en remplacement des enduits bâtarde prévues au marché. Cet enduit sera à réaliser en 2 couches suivant les FT produits
- Le traitement des points singuliers tels que les arrêtes, fractionnements, engravures existantes, couvre joints...
- Toutes sujétions de mise en œuvre

N° de prix	Désignation	Unité	Prix Unitaire en Euros HT	Quantité	Total en Euros HT
PN 4	Plus-value au prix III 205 pour traitement structural de parement existant	M2	250,00	18,50	4 625,00

5/ Prix nouveau n°05 : Réparation des murets de clôture périphérique

Les travaux ci-après répondent aux modifications d'ouvrages, et notamment au maintien du mur de clôture existante bordant la voie du SITOMAT. Les sondages réalisés après démarrage des travaux ont permis d'identifier le positionnement du talon du mur existant sous le trottoir. La démolition et reconstruction du mur tel que prévu au marché entraînerait la démolition du trottoir hors de l'emprise du site. Après examen structural du mur existant, le MOE a validé son maintien et défini avec l'entreprise des reprises structurales à réaliser. Ces derniers consistent principalement à :

- La réparation des épaufrures par pose d'acier HA en agrafes et coulage de béton C35/40 adjuvanté en résine de type SIKALATEX, y compris imprégnation d'une résine d'accroche. Des mortiers spéciaux à base de résine pourront être employés
- La réparation des fissures par rainurage et pose d'agrafes, fermetures en mortier hautes performances
- La reprise complète des unités de murs démolie avec une longrine assurant l'uniformité et la continuité du mur
- Le ragréage des parties visibles

Le présent prix est rémunéré au forfait :

N° de prix	Désignation	Unité	Prix Unitaire en Euros HT	Quantité	Total en Euros HT
PN 5	Réparation muret de clôture périphérique	Ft	4220,00	1,00	4 220,00

6/ Prix nouveaux n°06 et 7 : Réalisation de dallage renforcée sous les emprises de BOX

Pour répondre aux adaptations des aménagements, le présent prix rémunère au m2 la réalisation des dallages de BOX, comprenant :

- Les terrassements en masse
 - Les essais de portance
 - Les réglages et le compactage du fond de forme
 - La fourniture et la mise en place de géotextile d'un grammage supérieur à 180gr/m2
 - La fourniture et la mise en œuvre de 40cm de GNT 0/63 et finition 0/20
 - La mise en œuvre d'un polyane de dallage
 - Le coffrage, le ferrailage et le coulage d'une dalle béton de 25cm minimum, y compris les études, finition talochée fin par moyen mécanique. Le béton de type **C25/30 XC1-XC2 fibré sera renforcé par un durcisseur de surface incorporé à la finition, y compris cure, protection, traitement des joints de fractionnements...**
- Toutes sujétions de réalisation**

N° de prix	Désignation	Unité	Prix Unitaire en Euros HT	Quantité	Total en Euros HT
PN 6	Fourniture et mise en place de GNT sur 40cm	M3	94,00	95,00	8 930,00
PN 7	Fourniture et pose d'un géotextile	m2	2,20	246,00	541,20
III-214	Dalle béton lissé	m2	80,00	235,00	18 800,00

Modification de quantité : Pour le prix III-214 la modification porte sur la quantité qui passe de 40 m² à 235 m² entraînant une plus-value de 15 600 €.

7/ Prix nouveau n°08 : Fourniture et pose d'un escalier en acier galvanisé

Pour répondre aux adaptations des aménagements, le présent prix rémunère au forfait la mise en place d'un escalier métallique en acier galvanisé avec traitement des paliers et marches en caillebotis anti-dérapant, y compris palier en console, garde-corps normalisé. La réalisation de cet escalier sera rémunérée au forfait qui comprendra :

- Les attentes des infrastructure génie civil
- Massifs d'ancrage, supports et renforts
- Les études, dimensionnements, plan de fabrication, EXE, essais normalisés (1200joules)
- La fabrication en ateliers
- La galvanisation à chaud
- Le montage sur site, la fixation,
- La protection jusqu'à la réception des ouvrages
- Toutes sujétions de réalisation

N° de prix	Désignation	Unité	Prix Unitaire en Euros HT	Quantité	Total en Euros HT
PN 8	Fourniture et pose d'un escalier en acier galvanisé	Ft	5 250,00	1,00	5 250,00

8/ Prix nouveau n°09 : Barrière basculante de type VIDOK sur les hauts de quais

Pour répondre aux adaptations des aménagements, le présent prix permet de rémunérer au mètre linéaire la mise en place d'un équipement de quai de type relevable modèle VIDOK mis en œuvre dans les mêmes conditions et clauses que celles définies au prix III-209

N° de prix	Désignation	Unité	Prix Unitaire en Euros HT	Quantité	Total en Euros HT
PN 9	Barrière basculante de type VIDOK sur les hauts de quais	ml	522,00	30,00	15 660,00

Le total des prix nouveaux est de **103 902.20 €HT.**

Des ajustements de quantités sont réalisés conformément au nouveau BPU valant DEC annexé au présent avenant et se soldent par une moins value de **43 575.90 €.**

Article 3 : Prolongation des délais

La durée du marché est prolongée jusqu'au 30.09.24.

Article 4 : Incidence financière

Ces modifications augmentent le montant du B.P.U valant D.E.C. initial :

Montant du B.P.U. valant D.E.C. initial : 418 095.10 € H.T

Montant du présent avenant : 63 326.30 € H.T

Nouveau montant du marché : 478 421.40 € H.T.

Soit une augmentation de 14.43%.

Article 6 : Application des clauses de l'accord-cadre modifié

Toutes les clauses du marché ordinaire initial demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant n°1, lesquelles prévalent en cas de différence.

C – SIGNATURES

Fait à Toulon, le*23 mai 2024*.....

Pour la Métropole Toulon Provence
Méditerranée
Le Directeur général adjoint des services

Claude WEISSE

Pour COLAS

Benjamin ALLAIS

 **ETABLISSEMENT
DE TOULON**
582 avenue de Digne - B.P. 27
Z.I. de Toulon-Est - 83087 TOULON Cedex 9
Tél. : 04 94 14 74 24 - colas83@colas.com
Siret : 315 329 338 883 - FR75 329 338 883

AVT 1 – 23MRL06- LOT 3

ANNEXES

		MARCHE				AVENANT N°1			
N° Prix	Désignation	Unité	Quantité	PU	Total	Unité	Quantité	PU	Total
SERIE 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES									
III.101	Installation de chantier	Fl	1,00	20 984,20 €	20 984,20 €	Fl	1,00	20 984,20 €	20 984,20 €
III.102	Etude d'exécution	Fl	1,00	8 000,00 €	8 000,00 €	Fl	2,00	8 000,00 €	16 000,00 €
III.103	Signalisation de chantier	Fl	1,00	2 079,00 €	2 079,00 €	Fl	1,00	2 079,00 €	2 079,00 €
III.104	Démolition de mur y/c arasement	m²	280,00	72,00 €	20 160,00 €	m²	226,00	72,00 €	16 272,00 €
III.105	Installation, fourniture, maintenance, déplacement des séparateurs plastiques K16	ml	100,00	23,90 €	2 390,00 €	ml	0,00	23,90 €	- €
III.106	Installation, fourniture, maintenance, déplacement des séparateurs béton GBA	ml	10,00	44,70 €	447,00 €	ml	0,00	44,70 €	- €
Total Serie 100					54 060,20 €	55 335,20 €			
SERIE 200 : GENIE CIVIL / MENUISERIE EXTERIEURS									
III.201	Génie civil + béton	m²	70,00	199,80 €	13 986,00 €	m²	0,00	199,80 €	- €
III.202	Muret soutènement périphérique - allée	m²	300,00	268,00 €	80 400,00 €	m²	360,00	268,00 €	96 480,00 €
III.203	Emmarchement des quais y compris murs de soutènement des escaliers	Fl	1,00	10 000,50 €	10 000,50 €	Fl		10 000,50 €	- €
III.204	Emmarchement ouvrage EP y compris muret de soutènement aux abords de l'escalier	Fl	1,00	3 906,80 €	3 906,80 €	Fl	1,00	3 906,80 €	3 906,80 €
III.205	Réfection des enduits et arase des murs des quais existants	m²	500,00	60,20 €	30 100,00 €	m²	250,00	60,20 €	15 050,00 €
sous-total Génie Civil					138 393,30 €	115 436,80 €			
Menuiseries extérieures									
III.206	Portail double vantail (l= 3,75m) y compris poteaux	U	3,00	4 500,00 €	13 500,00 €	U	4,00	4 500,00 €	18 000,00 €
III.207	Portillon double vantail (l=2,00m) y compris poteaux	U	3,00	3 500,00 €	10 500,00 €	U	1,00	3 500,00 €	3 500,00 €
III.208	Fourniture et pose d'une clôture rigide H=1,80m	ml	100,00	45,00 €	4 500,00 €	ml	100,00	45,00 €	4 500,00 €
III.209	Fourniture et pose de parapet amovible en acier galvanisé - haut des quais	ml	120,00	804,10 €	96 492,00 €	ml	72,00	804,10 €	57 895,20 €
III.210	Fourniture et pose de parapet fixe - haut des quais	ml	60,00	352,40 €	21 144,00 €	ml	90,00	352,40 €	31 716,00 €
III.211	Fourniture et construction d'une ombrière	Fl	1,00	34 050,00 €	34 050,00 €	Fl		34 050,00 €	- €
sous-total Menuiseries					180 186,00 €	115 611,20 €			
Constructions Modulaire									
III.212	Fourniture et pose de bâtiments modulaires	m²	40,00	1 000,00 €	40 000,00 €	m²	64,20	1 000,00 €	64 200,00 €
III.213	Dépose des bungalows existants	Fl	1,00	2 255,60 €	2 255,60 €	Fl		2 255,60 €	- €
III.214	Dalle de Béton lissé pour fondation éléments modulaires (ép. 0,30m) y compris ferrailage	m²	40,00	80,00 €	3 200,00 €	m²	299,20	80,00 €	23 936,00 €
sous-total Modulaire					45 455,60 €	88 136,00 €			
Total Série 200					364 034,90 €	319 184,00 €			
TOTAL HT BASE PRIX DU MARCHE					418 095,10 €	374 519,20 €			



DGA Développement Durable et Valorisation du Territoire

Direction de la Transition Ecologique

Sous-Direction Prévention, Collecte et Valorisation des déchets

Chargé d'opération : G.CLAIR

Opération soutenue par l'état/dotation de soutien à l'investissement local et par la Région PACA

TITULAIRE :	COLAS FRANCE TERRITOIRE SUD EST 582 AV DE DIGNE BP 27 ZI TOULON EST 83 087 TOULON CDX 09
OBJET DU MARCHÉ :	MISE EN CONFORMITE DU PÔLE DE VALORISATION A HYERES

**ORDRE DE SERVICE A L'ENTREPRENEUR
N°01- Marché n°23MRL06 lot 3**

Le représentant de l'acheteur public notifie à l'entreprise COLAS FRANCE TERRITOIRE SUD EST, domiciliée au

582 AV DE DIGNE
BP 27 ZI TOULON EST
83 087 TOULON CDX 09

Titulaire du lot 3 GROS OEUVRE – MENUISERIES EXTERIEURES pour un montant de 418 095.10€ HT (501 714.12€ TTC)

l'ordre de démarrer les prestations d'exécution du marché de travaux à compter du 19/04/2023 et pour une durée de neuf (9) mois décomposée comme suit :

- Période de préparation : du 19/04/2023 au 31/05/2023
- Période d'exécution : du 01/06/2023 au 15/01/2024

Le titulaire devra, sous peine de forclusion, faire connaître ses réserves par écrit dans les quinze jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

A Toulon le

Pour le Président,
Par délégation,

Christine MORICE
Directeur Général Adjoint Développement Durable et
Valorisation du Territoire

ACCUSE DE RECEPTION

Je soussigné, *Benjamin ALLAIS*

représentant de l'entreprise titulaire désignée ci-dessus certifie avoir reçu un exemplaire du présent ordre de service.

A *La Gaude*, le *26/06/2023*

Signature et cachet :

 **ETABLISSEMENT
DE TOULON**
582 avenue de Digne - B.P. 27
Z.I. de Toulon-Est - 83087 TOULON Cedex 9
Tél. : 04 94 14 74 24 - colas83lagarde@colas.com
Siret : 329 338 883 01532 - FR75 329 338 883

DGA Développement Durable et Valorisation du Territoire
Direction de la Transition Ecologique
Sous-Direction Prévention, Collecte et Valorisation des déchets
Chargé d'opération : G.CLAIR

Opération soutenue par l'état/dotation de soutien à l'investissement local et par la Région PACA

TITULAIRE :	COLAS 582 AV DE DIGNE BP 27 ZI TOULON EST 83 087 TOULON CDX 09
OBJET DU MARCHÉ :	MISE EN CONFORMITE DU PÔLE DE VALORISATION A HYERES

ORDRE DE SERVICE A L'ENTREPRENEUR N°02- Marché n°23RL06 lot 3

Compte tenu :

- de la présence de polluants découvert dans les sols nécessitant des analyses complémentaires en cours afin de déterminer la destination de ces matériaux
- des effondrements de fouilles du bassin de confinement incendie survenus le 06/07/2023 ayant nécessité des travaux urgents de confortement puis conduit à l'interruption des travaux du lot 1 le temps de réaliser des études techniques complémentaires

Le Maître d'ouvrage décide de :

- **Rallonger le délais contractuel** de la durée correspondant à la période d'inactivité du chantier, soit du 04/08/2023 jusqu'à la présente interruption des travaux, soit 2 mois. Cette prolongation sera notifiée ultérieurement par avenant.

- **D'interrompre les travaux à compter du 02/10/2023** pour l'ensemble des lots

Cette interruption des travaux permettra la mise au point sécuritaire et technique du chantier, et notamment :

- de définir la gestion des déchets pollués
- de réaliser les études complémentaires pour la pose du bassin de confinement incendie, ainsi que les impacts sur les ouvrages avoisinants et l'adaptation des infrastructures réseaux

Les travaux devront reprendre au plus tard le 15 octobre 2023, sous réserves des visas délivrés par le maître d'œuvre pour la mise à jour du dossier d'exécution. Un OS de reprise sera délivré.

Le présent OS :

Prolonge le délai d'exécution des travaux de 2 mois

Demande l'interruption des travaux à compter du 02/10/2023

Le titulaire devra, sous peine de forclusion, faire connaître ses réserves par écrit dans les quinze jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

A Toulon le

Pour le Président,
Par délégation,


Christine MORICE

Directeur Général Adjoint Développement Durable et
Valorisation du Territoire

ACCUSE DE RECEPTION

Je soussigné, *Benjamin ALLAIS*

représentant de l'entreprise titulaire désignée ci-dessus certifie avoir reçu un exemplaire du présent ordre de service.

A *La Gaude*, le *29/9/2023*

Signature et cachet :

 ETABLISSEMENT
DE TOULON
552 avenue de Digne - B.P. 27
Z.I. de Toulon-Est - 83008 TOULON Cedex 9
Tél. : 04 94 14 74 24 - colas@lagarde@colas.com
Siret : 520 000 000 000 000



DGA Développement Durable et Valorisation du Territoire
Direction de la Transition Ecologique
Sous-Direction Prévention, Collecte et Valorisation des déchets
Chargé d'opération : G. CLAIR

Opération soutenue par l'état/dotation de soutien à l'investissement local et par la Région PACA

TITULAIRE :	COLAS FRANCE TERRITOIRE SUD EST 582 AV DE DIGNE BP 27 ZI TOULON EST 83 087 TOULON CDX 09
OBJET DU MARCHÉ :	MISE EN CONFORMITE DU PÔLE DE VALORISATION A HYERES

ORDRE DE SERVICE A L'ENTREPRENEUR N°03- Marché n°23RL06 lot 3

Le représentant de l'acheteur public notifie au titulaire une reprise des travaux à la date du 23 octobre 2023 qui commencera par le chargement des terres impropres à la réutilisation sur site en vue de leur évacuation par un tiers.

Le titulaire devra, sous peine de forclusion, faire connaître ses réserves par écrit dans les quinze jours qui suivent la remise du présent ordre de service.

A Toulon le

Pour le Président,
Par délégation
Christine MORICE
Directeur Général Adjoint Développement Durable et
Valorisation du Territoire

ACCUSE DE RECEPTION

Je soussigné, *Benjamin ALLAIS, Directeur d'Agences*

représentant de l'entreprise titulaire désignée ci-dessus certifie avoir reçu un exemplaire du présent ordre de service.

A La Gaude le 29/10/23

Signature et cachet :

ETABLISSEMENT
DE TOULON
COLAS
WE OPEN THE WAY 582 avenue de Digne - B.P. 27
Z.I. de Toulon-Est - 83087 TOULON Cedex 9
Tél. : 04 94 14 74 24 - colas83lagarde@colas.com
Siret : 525 338 583 00012 • FR 75 329 338 883
